Druk nr 532

Warszawa, 9 maja 2016 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Ministerstwo Środowiska
Podsekretarz Stanu
DZW-II.5122.2.2016.KB

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013", w załączeniu przekazuję

- **„Informację o realizacji Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015 w roku 2015".**

Z poważaniem

(-) Mariusz Gajda

Zatwierdzam

Minister Środowiska

KZGW
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej



Widok z góry na zaporę zbiornika wodnego Świnna Poręba i wieżę ujęciową i spustową wraz z rzeką Skawą.

INFORMACJA O REALIZACJI

Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015

W ROKU 2015

Maj 2016 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie str. 4

2. Realizacja w 2015 r. *„Programu budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2015".* str. 5-13

2.1 Finansowanie *„Programu..."* w 2015 r. str. 5-7

2.2 Uwarunkowania formalno – prawne realizacji *„Programu..."* w roku 2015. str. 7-9

2.3. Zakres rzeczowy *„Programu..."* zrealizowany w 2015 r. str. 10-13

3. Ocena realizacji *„Programu budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2015"* w roku 2015. str. 14-15

Załącznik. Dokumentacja fotograficzna str. 16

1. Wprowadzenie

Realizacja przedsięwzięcia *„Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba"* rozpoczęta została w roku 1986, w podziale na zadania: Zadanie I – Zbiornik, Zadanie II – Przebudowa dróg, Zadanie III – Przebudowa kolei oraz Zadanie IV – Ochrona zlewni zbiornika.

Biorąc pod uwagę sposób finansowania i podstawy prawnej realizacji przedsięwzięcia *„Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba"* wyróżnić można okresy:

- do 1999 r. inwestycja finansowana była z budżetu państwa, jako inwestycja centralna,
- 2000-2004 decyzją Parlamentu RP finansowanie wszystkich inwestycji gospodarki wodnej, w tym również budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w 2005 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy poselskiej prowadził prace nad ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego *„Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010"*, która ze względu na niewystarczające finansowanie pomimo zapisanych w ustawie środków była dwukrotnie aktualizowana:
  - ✓ 01.04.2011. r. - wydłużyła ona realizację o trzy lata do 2013 r. wprowadzono też finansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - ✓ dnia 30.12.2013 r. - wydłużyła realizację o kolejne dwa lata do 2015 r.

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego *„Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2015"* przestała obowiązywać z końcem 2015 r.

2. Realizacja w 2015 r. *„Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015".*

Zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji **na dzień 31 grudnia 2015 r.** wynosi 95,5 % (*w stosunku do ustawy z dnia 06.12.2013 r.*), w ramach poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Zadanie I – Zbiornik – stan rzeczowego zaawansowania prac w ramach Zadania I wynosi 97,6 %.

Zadanie II – Przebudowa dróg – zaawansowanie prac związanych z przebudową dróg wynosi 89,3%.

Zadanie III – Przebudowa kolei – zostało zakończone.

Zadanie IV – Ochrona zlewni zbiornika – zostało zakończone.

2.1 Finansowanie *„Programu..."* w 2015 r.

Finansowanie niezgodne z harmonogramem zawartym w ustawach oraz planowane w 2015 r. zakończenie realizacji inwestycji były powodem opracowania przez RZGW w Krakowie harmonogramu dokończenia realizacji przedsięwzięcia w 2015 r. na kwotę **153,9 mln zł**. Zakładał on środki finansowe przewidziane w ustawie w wysokości **80,8 mln zł w poziomie cen 2013 r.** (83,7 tys. zł w poziomie cen 2015 r.) oraz niewykorzystane z roku 2013 i nieotrzymane z roku 2014.

W roku 2013 nie było możliwości zrealizowania robót za pełną kwotę przewidzianą w harmonogramie ustawy, z powodu opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, nie wykorzystana kwota wynosiła **42 mln zł**.

Natomiast w 2014 r. z przewidzianej w ustawie kwoty 241,1 mln zł w poziomie cen 2013 r. (246,9 mln zł w p. c. 2014 r.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymał jedynie kwotę w wysokości 210 mln zł i to w dwóch etapach.

Inwestor nie otrzymał kwoty w wysokości **31,1 mln zł.**

Tak więc zgodnie z założeniami ustawowymi niezbędna do zrealizowania Programu kwota na 2015 r. powinna wynosić 153,9 mln zł w p. c. 2013 r. (42 mln zł z 2013 r. + 31,1 mln zł z 2014 r. + 80,8 mln zł).

RZGW w Krakowie złożył w dniu 30.09.2014 r., zgodnie z procedurą do NFOŚiGW, wniosek o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w roku 2015 na kwotę **153,9 mln zł** (162,6 mln zł w p. c. 2015).

Ustalenia wysokości kwoty dotacji w 2015 r. trwały od września 2014 r. do marca 2015 r., a jej wartość zmieniała się sześciokrotnie, aby ostatecznie 11.03.2015 r. została podpisana umowa Nr 59/2015/Wn-06/GW-ZB/D o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji na kwotę **80,8 mln zł**.

Podział środków dotacji na poszczególne kwartały przedstawiał się następująco:

- I kwartał - 7,6 mln zł
- II kwartał - 33,7 mln zł
- III kwartał - 27,9 mln zł
- IV kwartał - 11,6 mln zł
- Razem: **80,8 mln zł**

z podziałem na poszczególne zadania:

- **Zadanie I – Zbiornik** **46,2 mln zł**
- **Zadanie II – Przebudowa dróg** **17,1 mln zł**
- **Zadanie III – Przebudowa kolei –** **0,8 mln zł**
- **Rezerwa** **16,7 mln zł**
- **Razem** **80,8 mln zł**

Z powodu długotrwałej suszy hydrologicznej jaka miała miejsce w roku 2015 nie było możliwe gromadzenie wody i rozpoczęcie piętrzenia zbiornika. Brak piętrzenia uniemożliwił realizację następujących robót objętych harmonogramem:

1. rozruch elektrowni – uruchomienie turbozespołów i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej wymaga piętrzenia zbiornika i zapewnienia stabilnego przepływu.

2. doszczelnienie galerii kontrolno – zastrzykowej. Doszczelnienie należy wykonywać przy parciu wody, która ujawnia ewentualne nieszczelności.

3. rozruch obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego – instrukcja pierwszego napełniania wymaga przeprowadzenia rozruchu obiektu i obserwacji aparatury kontrolnej w czasie piętrzenia.

4. ośrodek zarybieniowy – rozruch i modernizacja stawów ziemno – betonowych. Brak piętrzenia uniemożliwił pełne zaopatrzenie ośrodka w wodę ze zbiornika co nie pozwala na wdrożenie pełnej eksploatacji obiektu.

5. wycinka wiklin w czaszy zbiornika – ze względu na szybki porost wiklin i ich negatywny wpływ na jakość wody w zbiorniku, wycinki należy przeprowadzić bezpośrednio przed zalaniem czaszy zbiornika aby uniknąć kosztów powtórnej wycinki.

Nie wykorzystane na powyższych obiektach środki zostały przeniesione na inne pozycje harmonogramu.

Ostatecznie wykorzystanie środków w poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Zadanie I - zbiornik	**43,1 mln zł**
Zadanie II - przebudowa dróg	**24,9 mln zł**
Zadanie III – przełożenie linii kolejowej	**0,9 mln zł**
Rezerwa	**11,9 mln zł**
Razem	**80,8 mln zł**

2.2. Uwarunkowania formalno – prawne realizacji Programu w roku 2015.

W 2015 r. pozyskano następujące decyzje:

Zadanie I – Zbiornik

- pozwolenie na budowę linii napowietrznej 15kV kolidującą z budową nasypu kolejowego i drogowego (decyzja nr 293/2015 z dnia 25.05.2015 r.) wydane przez Starostę Wadowickiego - w czasie budowy wykonano linię tymczasową, docelowo wykonano nową linię na nasypie kolejowym i moście drogowym),
- pozwolenie na wykonanie odwodnienia osuwiska nr 11 A w rejonie Dąbrówki (decyzja nr 458/2015 z dnia 23.07.2015 r.) wydane przez Starostę Wadowickiego,
- pozwolenia na rozbiórki wydane przez Starostę Wadowickiego:

- ✓ mostu drogowego w m. Dąbrówka zlokalizowanego w czaszy zbiornika (decyzja nr 759/2015 z dnia 14.12.2015 r.) oraz rozbiórkę mostu drogowego nad rzeką Skawą w m. Mucharz (decyzja nr 613/2015 z dnia 09.10.2015 r.),
- ✓ linii napowietrznej 15 kV (decyzja nr 293/2015 z dnia 29.05.2015 r.),
- ✓ budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1439 w m. Mucharz (decyzja nr 506/2015 z dnia 17.08.2015 r.),

– pozwolenie na użytkowanie Ośrodka Zarybieniowego poniżej zapory Świnna Poręba (decyzja nr 83/2015 z 15.04.2015 r.) wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach,

– pozwolenie na użytkowanie gospodarstwa Rybackiego „Rybaczówka" wraz z drogą dojazdową (decyzja nr 208/2015 z 02.10.2015 r.) wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach,

– pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych – hydrotechnicznych, budowli regulacyjnych na potoku Marcówka w km 0+000-2+600 (decyzja nr 1015/2015 z 02.10.2015 r.) wydane przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie,

– pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych zapory bocznej i pompowni melioracyjnej na brzegu potoku Jaszczurówka (decyzja nr 1013/2015 z 02.10.2015 r.) wydane przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie,

– pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlano-hydrotechnicznych potoku Jaszczurówka na odc.km 3+050-2+400 (decyzja nr 1014/2015 z 02.10.2015 r.) wydane przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie,

– pozwolenie na użytkowanie budynku elektrowni wraz z drogą dojazdowa i placami manewrowymi (decyzja nr 1033/2015 z 07.10.2015r.) wydane przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie,

– pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych hydrotechnicznych w zakresie ubezpieczeń brzegów rzeki Skawy w km 26+500-23+900 (decyzja nr 1209/2015 z 25.11.2015 r.) wydane przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Zadanie II – Przebudowa dróg

- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej klasy L wraz z budową mostu na potoku Paleczka – etap II od km 0+814 - 0+895 (decyzja nr 192/2015 z dnia 15.09.2015 r.) wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach,
- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi klasy D Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka z obiektami inżynierskimi zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i Wadowice (decyzja nr 1/2015 z dnia 08.05.2015 r.) wydane przez Starostę Wadowickiego,
- pozwolenie na użytkowanie drogi powiatowej klasy L i mostu drogowego nad korytem rzeki Stryszówka (decyzja nr 192/2015 z 04.09.2015 r.) wydane przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach,
- pozwolenie na użytkowanie drogi gminnej klasy L (droga wzdłuż obwałowania Zembrzyc) na terenie gminy Zembrzyce wraz z niezbędną infrastrukturą (decyzja, znak: NBZ.6741.20.2015 z 08.09.2015 r.) wydane przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej

Zadanie III – Przebudowa kolei

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - budowli hydrotechnicznej, obejmujące nasyp hydrotechniczny ziemny na terenie gminy Stryszów (decyzja nr 79/2015 z 05.02.2015 r.).

2.3. Zakres rzeczowy „Programu..." zrealizowany w 2015 r.

Zakres rzeczowy zrealizowany w roku 2015 w ramach poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Zadanie I – Zbiornik

Obiekt	Roboty	Zakres rzeczowy		
		planowany		wykonany
		Jedn.	Ilość	
WYKUPY GRUNTÓW I BUDYNKÓW	wykupy gruntów pod czaszę zbiornika i inne obiekty	ha	60	18,19
	wykup budynków	szt.	5	0
CZASZA ZBIORNIKA	obwałowanie dworu w Jaszczurowej - zapora boczna	m^3	40 000	40 000
	obwałowanie dworu w Jaszczurowej - most z dojazdami	m^2	227	227
	obwałowanie dworu w Jaszczurowej - zbiornik retencyjny pompowni	m^3	3 490	3 490
	obwałowanie dworu w Jaszczurowej - przesłona	m^3	557	557
	obwałowanie dworu w Jaszczurowej - chodnik	m	244	244
	budynek pompowni z wyposażeniem	kpl.	1	1
	oświetlenie przy obwałowaniu	m	400	400
	przełożenie potoku Jaszczurówka: koryto prostokątne	m^3	13,5	13,5
	przełożenie potoku Jaszczurówka: koryto trapezowe	m	9	9
	wylesienia (wycinki lasów i wykrzaczenia)	ha	410	324
	wycinka drzew	szt.	10 000	20 692 *Zgodnie z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami*
	rozbiórki budynków, linii energetycznych itp.	szt.	23	25
	rozbiórka dróg technologicznych	km	5	3,03
	ubezpieczenie brzegów zbiornika w Dąbrówce i Skawcach	m^2	10 000	4 333 *brak środków na wykonanie całości*
	rozbiórka mostu stalowego na rzece Skawie	szt.	1	0
	rozbiórka mostu stalowego w Stryszowie	szt.	1	0
	rozbiórka dróg asfaltowych i obiektów żelbetowych	km	6	3
	nasyp hydrotechniczny Stryszów: humusowanie	ha	13	10
	nasyp hydrotechniczny Stryszów: płyty betonowe	m^3	300	426 *zgodnie z zaleceniem przyszłego użytkownika PKP*
	makroniwelacja terenu po eksploatacji żwirów	ha	40	31,55
	makroniwelacja toni połowowych	ha	124	124
	załądowanie osuwiska 11B w Dąbrówce	m^3	30 000	30 000
	system kontrolno-pomiarowy brzegów zbiornika-monitoring	kpl.	1	0
	Inwentaryzacja obiektów zapory i czaszy	m^3	1 200	1 150
	badania archeologiczne	ar	108	108

ZAPORA	cementacja	m	260	0 *niemożliwe było wykonanie z uwagi na brak piętrzenia*
	Cementacja – doszczelnienie elementów betonów galerii kontrolno-zastrzykowej.	m	67	67
	hydrofornia	kpl.	1	0
	ogrodzenie obiektów przekroju piętrzenia	m	50	50
	ławki i bramki na koronie zapory	szt.	3	3
	AKP zapory	kpl.	0,1	0,1
	kładka na wieżę ujęciową – renowacja powłok	kpl.	1	1
	remont mostu na potoku Wyszulec	kpl.	1	1
	zabezpieczenie betonów wież	m^2	2 000	2 000
	dolne stanowisko – zagospodarowanie	kpl	1	1
INNE OBIEKTY PRZEKROJU PIĘTRZENIA	elektrownia wodna – zagospodarowanie terenu	m^2	1 000	998,40
	kabel zasilania GPZ	km	9	9
OBIEKTY ZAPLECZA EKSPLOATACYJNEGO	budynek administracyjny - zagospodarowanie terenu	m^2	5 404	5 404
	zabudowa części magazynowo technicznej	kpl.	1	1
	hala magazynowa	kpl.	1	1
SIECI ZEWNETRZNE DLA OBIEKTÓW PIETRZENIA I EKSPLOATACJI	przyłączenie obiektów zapory do sieci wraz ze stacją transformatorową	m	315	315
PRZEBUDOWA OBIEKTÓW LINIOWYCH NA OBRZEŻU ZBIORNIKA	przełożenie linii teletechnicznej wzdłuż potoku Stryszówka	m	1 500	*roboty wykonane ujęte w Zadaniu II (droga wzdłuż kolei)*
	przełożenie linii SN w Dąbrówce	m	230	*roboty wykonane ujęte w Zadaniu II*
	przełożenie kabla energetycznego 15kV w Stryszowie	m	1 000	946
OBIEKTY TOWARZYSZACE	Ośrodek zarybieniowy – wykonanie rowu odwadniającego	kpl.	1	1
	Ośrodek zarybieniowy – doszczelnienie stawów ziemno-betonowych	szt.	10	10
ZABUDOWA PRZECIWRUMOWISKOWA	ustalenie linii brzegowej – odszkodowania za grunty	ha	0,7317	0,7317
	wycinka drzew i wykrzaczenia	kpl.	1	1
	ubezpieczenie brzegów rzeki Skawy km 26+500-23+900	m	1426	1426
	regulacja potoku Marcówka	m	2 480	2480
ŚRODKI TRWAŁE DLA POTRZEB RZGW	wyposażenie zapory	kpl.	1	1
POZOSTAŁE KOSZTY POŚREDNIE	prace komisji rozruchowej	m-c	9	1

Ponadto w ramach Zadania I prowadzono obsługę geodezyjną budowy, nadzór geologiczny, nadzór archeologiczny, pomiary aparatury kontrolno-pomiarowej.

Szacunkowy stan rzeczowego zaawansowania prac w ramach tego zadania wynosił na koniec 2015 r. 97,6%.

Zadanie II – Przebudowa dróg

W zakresie zadania II realizowano następujące roboty drogowe:

Zadanie	Obiekt	Roboty	Zakres rzeczowy		
			planowany		wykonany
			Jedn.	Ilość	
ZADANIE II PRZEBUDOWA DRÓG	DROGA KRAJOWA 28 (na odcinku Świnna Poręba - Zembrzyce)	Etap IV DK 28 km 9+510-10+090			
		przełożenie linii światłowodowej	m	2 500	7 500 w zestawieniu podano *łącznie 3 kable*
		zjazd do Amalu	m	36	0 *wykonano zjazd tymczasowy, nie zalegalizowano z uwagi na brak pozwolenia*
		most drogowy nr 8 i 10 – wykonanie stożków i ubezpieczeń	kpl.	2	2
		osuwisko przy przepuście nr 6: przypora kamienna	m^3	28 808	28 808
		osuwisko przy przepuście nr 6: palisada po terenie	m	133	133
		osuwisko przy przepuście nr 6: ubezpieczenie	m^2	180	180
		osuwisko przy przepuście nr 6: likwidacja kolizji 15kV	m	150	150
	DROGI LOKALNE	droga gminna przy wale i na wale przeciwpowodziowym rz. Skawy	m	1 145	1 145
		droga klasy L wraz z mostem na potoku Paleczka	m	772,5	772,5
		most drogowy na potoku Paleczka	m	107,5	107,5
		droga wzdłuż kolei wraz z obiektem mostowym	m	300	300

Zaawansowanie rzeczowe realizacji zadania II szacuje się na poziomie 89,3%.

Zadanie III – Przebudowa kolei

Roboty zostały w całości wykonane w 2014 r. W ramach zadania III w 2015 r. wykupiono 2,3369 ha gruntów. Zakres rzeczowy zadania wykonano w 100%.

W 2015 roku zostały wykonane następujące roboty w ramach:

Zadania I – Zbiornik

- wykonywano roboty związane z czyszczeniem czaszy zbiornika: wycinki, wykrzaczenia, makroniwelacja terenu, rozbiórki dróg technologicznych, budynków, linii energetycznych , mostów ,
- wykonano ubezpieczenie brzegów zbiornika w Dąbrówce i Skawcach,
- zakończono roboty przy nasypie hydrotechnicznym w Stryszowie,

- zrealizowano prace wykończeniowe na zaporze: ławki i bramki, dokończono ogrodzenie obiektów w przekroju piętrzenia,
- zakończono montaż integracyjnych systemów teletechnicznych zapory Świnna Poręba,
- budynek elektrowni - zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu elektrowni,
- wykonano kabel zasilania do głównego punktu zasilania,
- zrealizowano prace związane z zalądowaniem osuwiska 11B w Dąbrówce,
- zakończono roboty związane z ubezpieczeniem brzegów koryta rzeki Skawy oraz potoku Marcówka

W roku 2015 r. wykupiono 13,7126 ha i przejęto decyzjami 4,4736 ha gruntów, wygaszono trwały zarząd 1,2536 ha. Łącznie w trwałym zarządzie RZGW pozostaje 1 154,7347 ha gruntów.

Zadania II – Przebudowa dróg

- zakończono budowę drogi klasy L na nasypie wzdłuż linii kolejowej z obiektem mostowym,
- zakończono drogę klasy L z mostem drogowym na potoku Paleczka,
- zakończono drogę przy i na wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy,
- zakończono prace zabezpieczające na osuwisku przy drodze krajowej nr 28

Zadanie III – Przebudowa kolei

Wykupiono 2,3369 ha gruntów.

3. Ocena realizacji *„Programu budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2015"* w roku 2015.

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji, gdzie finansowanie inwestycji „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba", opierało się o zapisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego *„Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2015"*.

Ze względu na niezgodne z harmonogramem zawartym w ustawie finansowaniem oraz opóźnienia realizacyjne, nie było możliwe zrealizowanie wszystkich robót. Dodatkowo panująca w 2015 r. susza hydrologiczna wymusiła zmianę realizacji założonego na 2015 r. planu.

Do zakończenia inwestycji pozostały do wykonania następujące roboty, na które zabrakło środków:

- rozruch „na mokro" zapory oraz czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba,
- rozruch elektrowni,
- wycinka drzew i krzewów w czaszy zbiornika,
- rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika,
- doszczelnienie galerii kontrolno-zastrzykowej na etapie piętrzenia,
- opłaty z wyłączenia produkcji rolnej i leśnej,
- ustabilizowanie osuwiska 11A i 11B,
- ustabilizowanie osuwiska Ostałowa,
- ustabilizowanie osuwiska 1/21,
- budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka,
- budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka,
- rozbiórka mostów na Skawie i na potoku Stryszówka

Wszystkie ww. roboty znajdują się w programie inwestycyjnym i nie są robotami dodatkowymi.

Realizacja dróg jest niezbędna do odtworzenia układu komunikacyjnego zaburzonego budową zbiornika.


Do Marszałka Sejmu RP został złożony projekt poselski ustawy *o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba* na kwotę 53 230 tys. zł, obejmującą realizację obiektów warunkujących piętrzenie zbiornika.

Załącznikiem do informacji o realizacji programu „Program..." w 2015 r. jest dokumentacja fotograficzna.

INFORMACJA O REALIZACJI
„PROGRAMU BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA W LATACH 2006 – 2015"
W ROKU 2015


ZAŁĄCZNIK

PLAN SYTUACYJNY WRAZ DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ

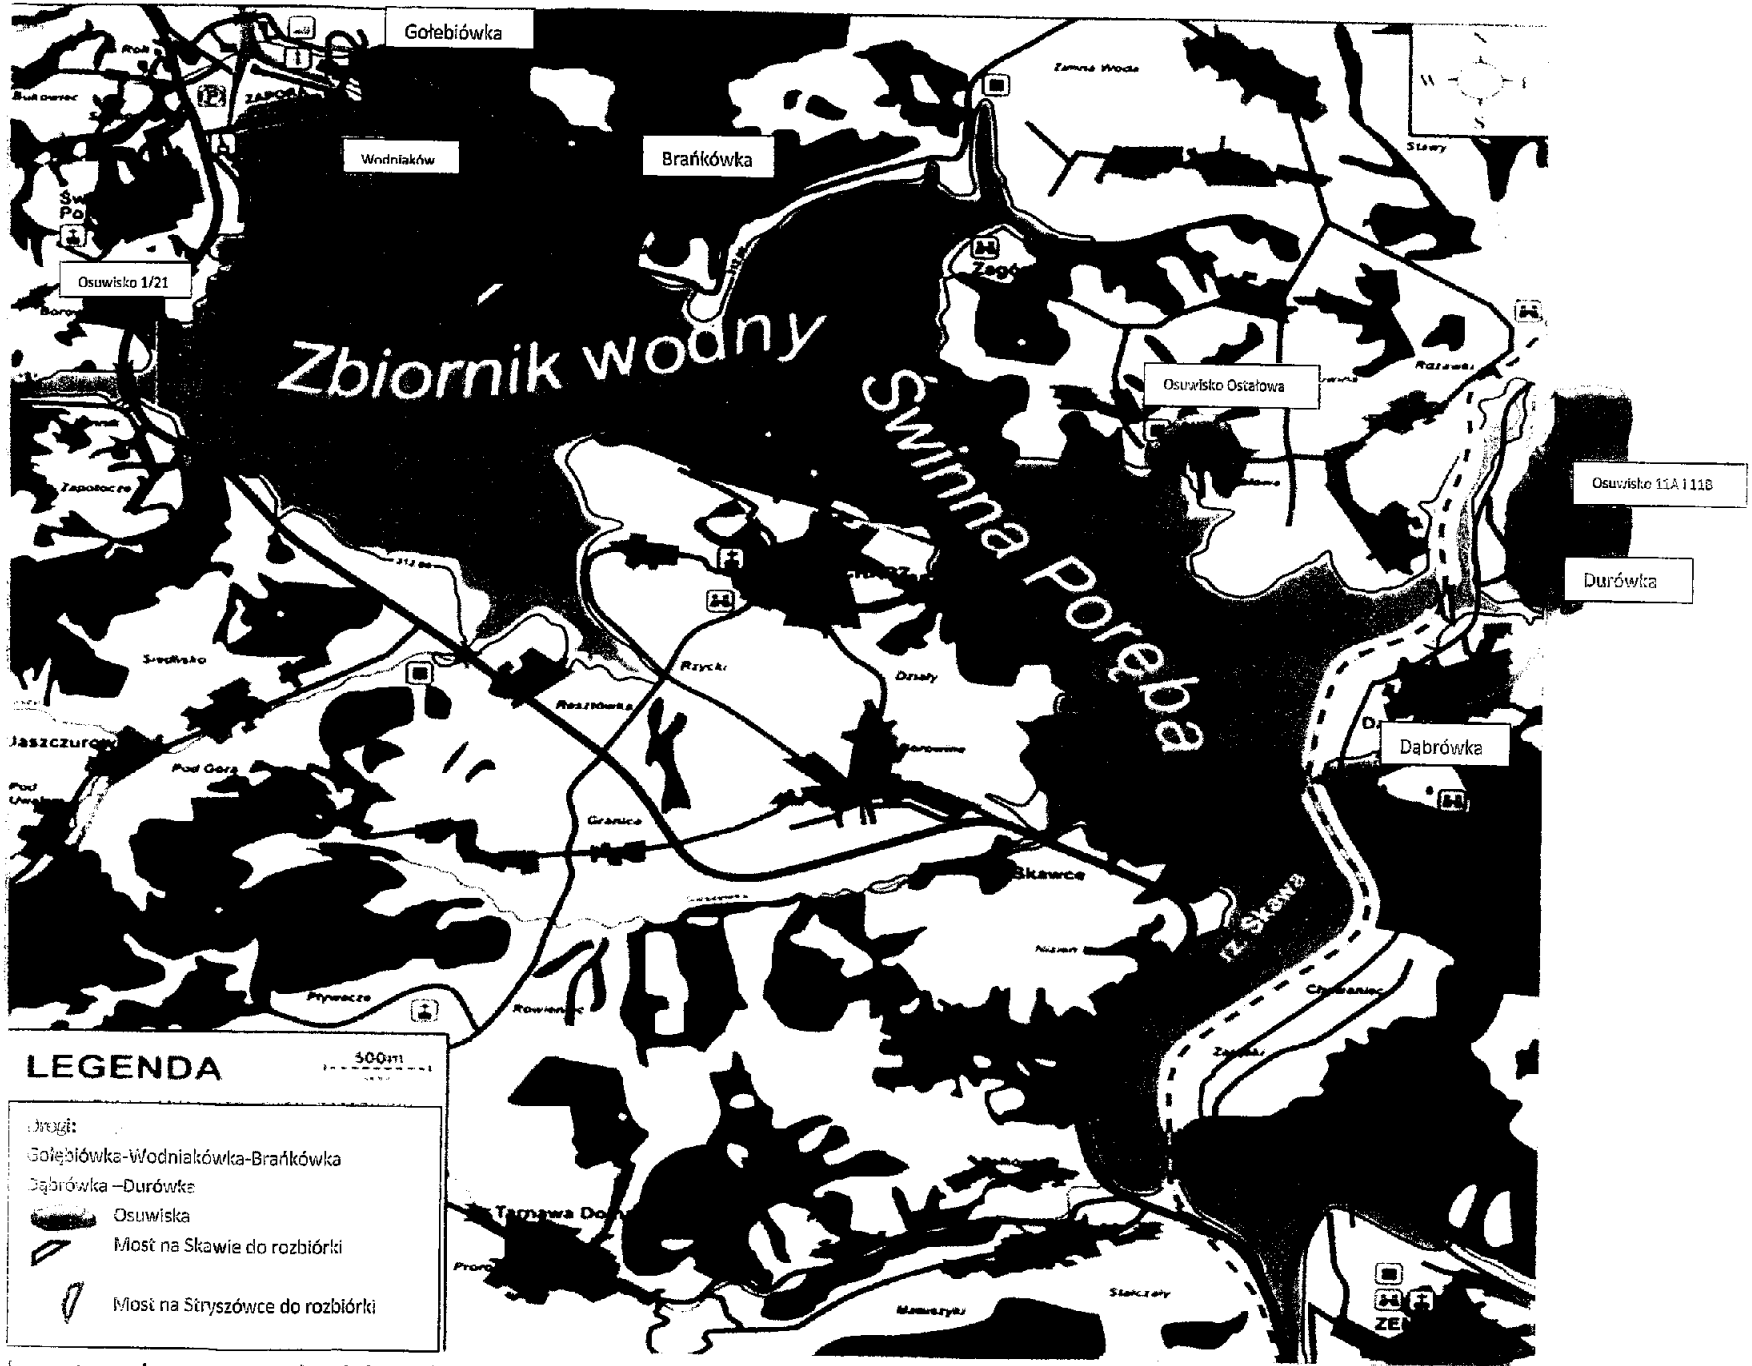

Plan sytuacyjny z pozostałymi do wykonania drogami, osuwiskami i mostami koniecznymi do rozbiórki.


Zadanie I – Zbiornik

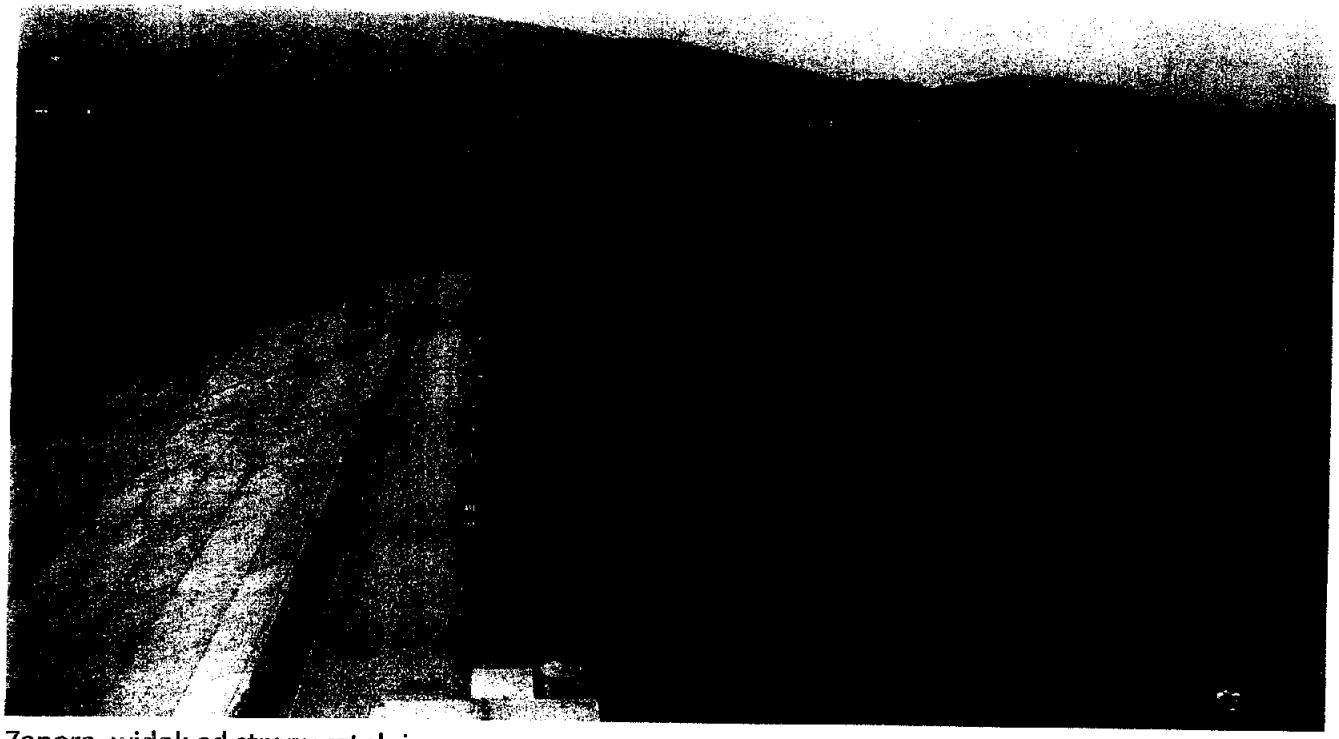


Zapora, widok od strony sztolni.




Zapora, widok od strony drogi krajowej 28.

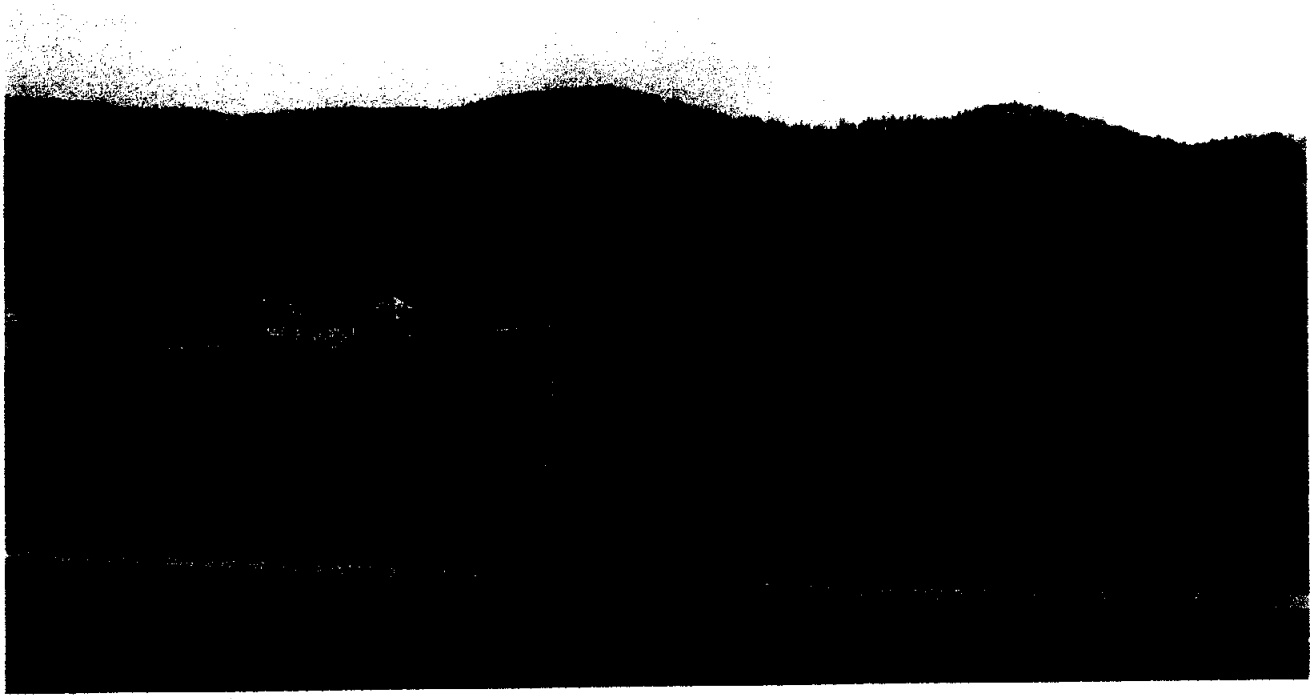


Zapora, skarpa odpowietrzna.

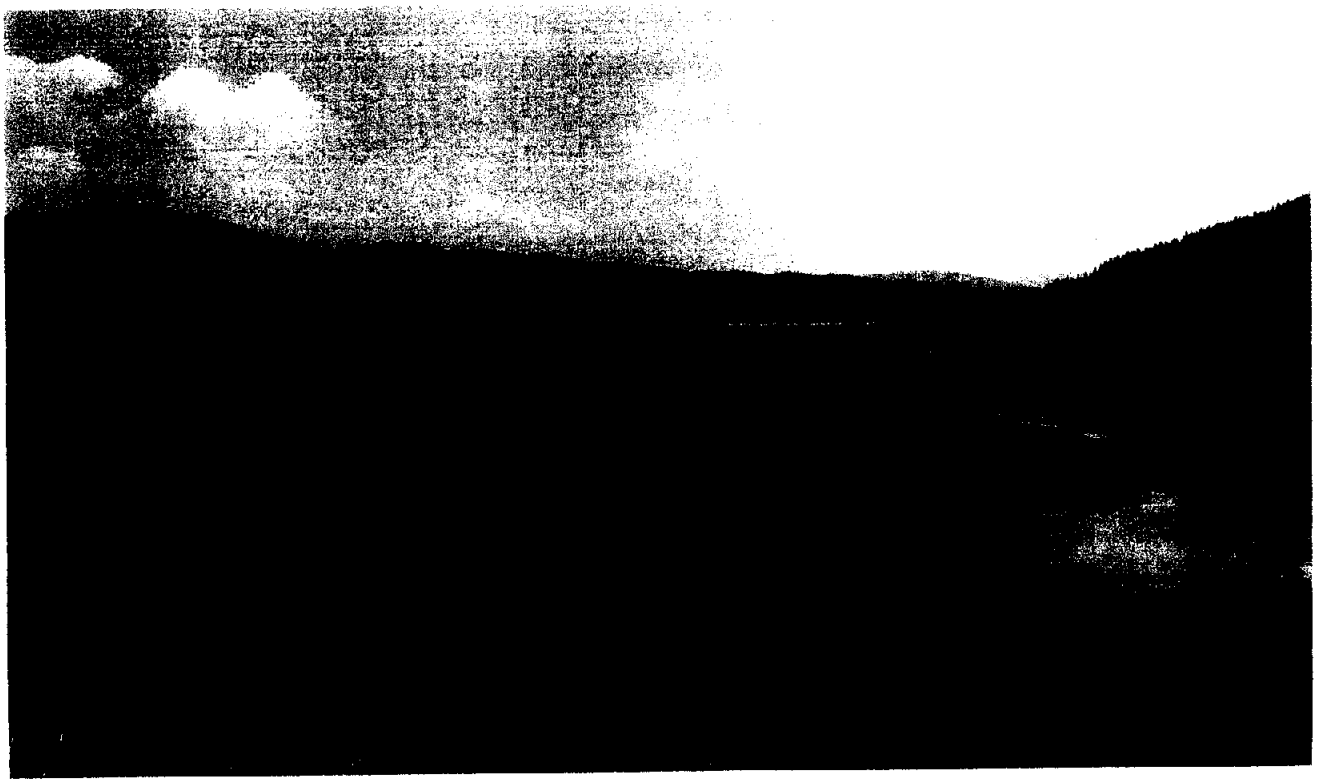


Czasza zbiornika.

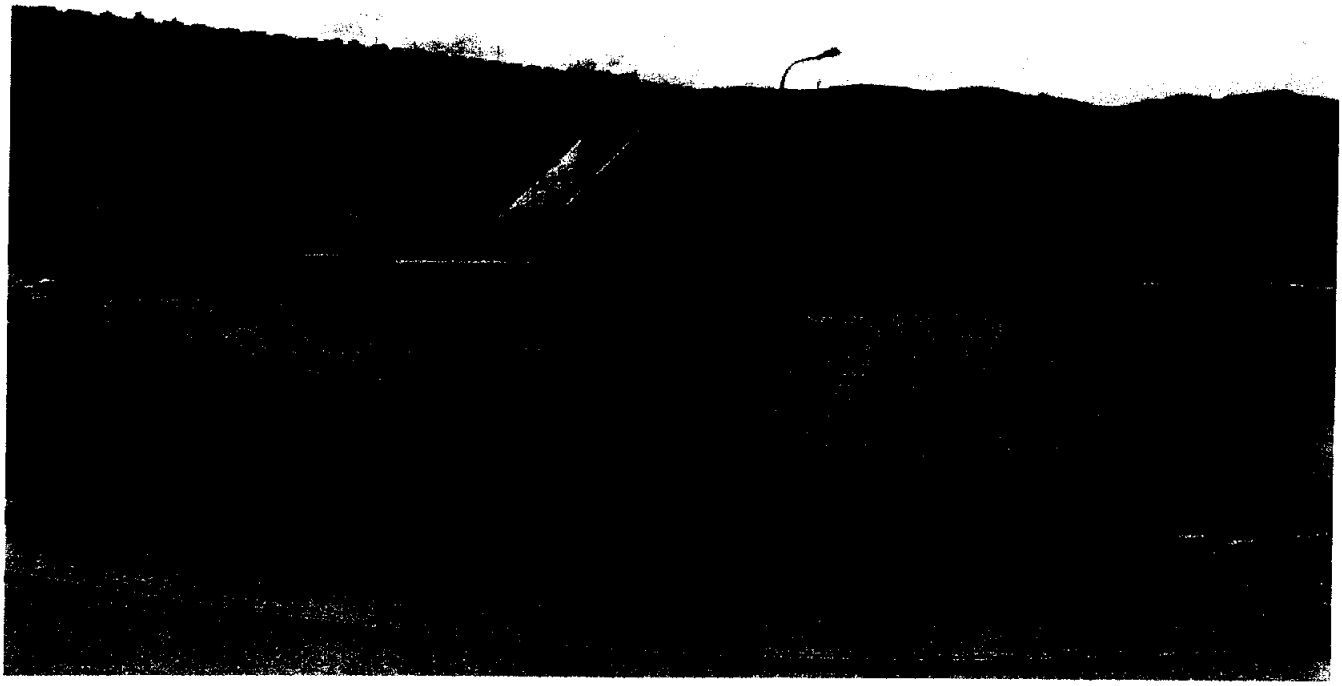


Zagospodarowanie terenu wokół elektrowni wodnej.

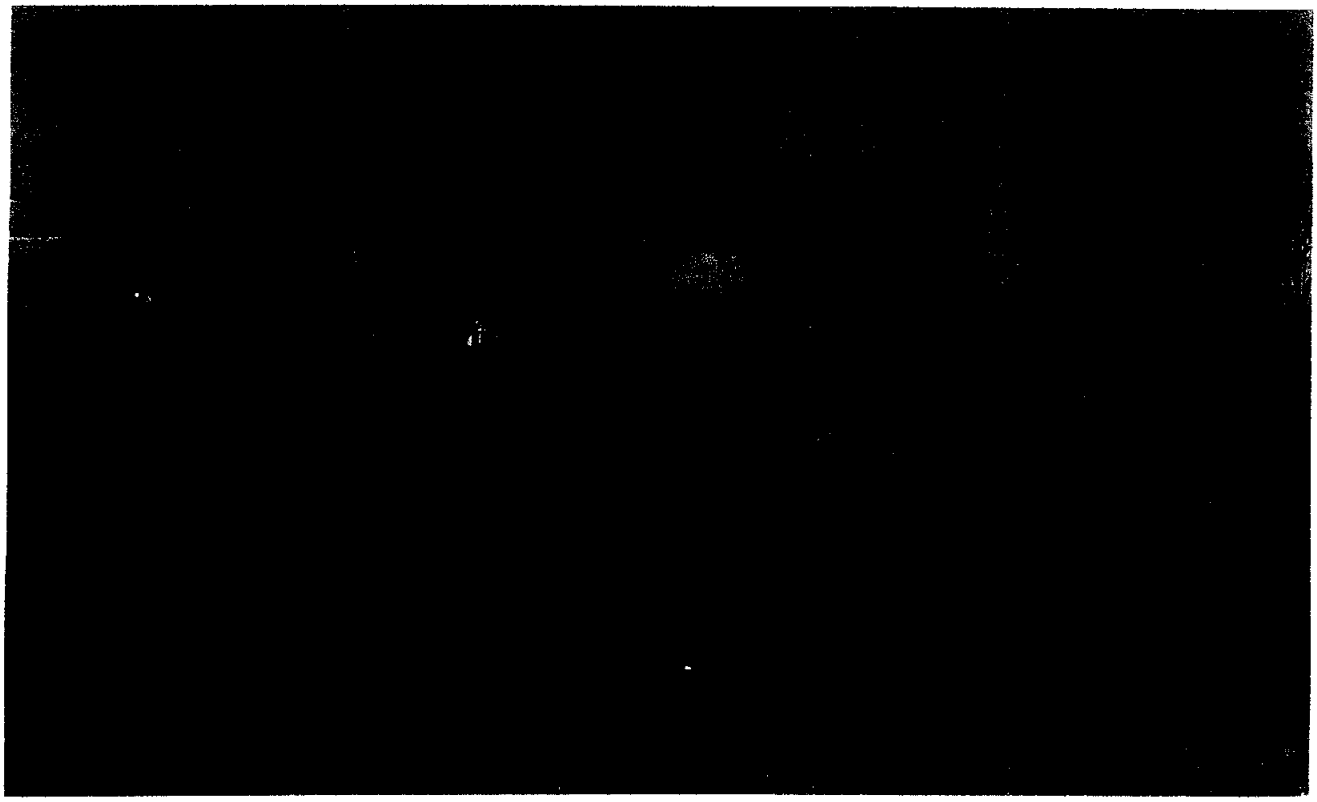

Osuwisko w Ostałowej.

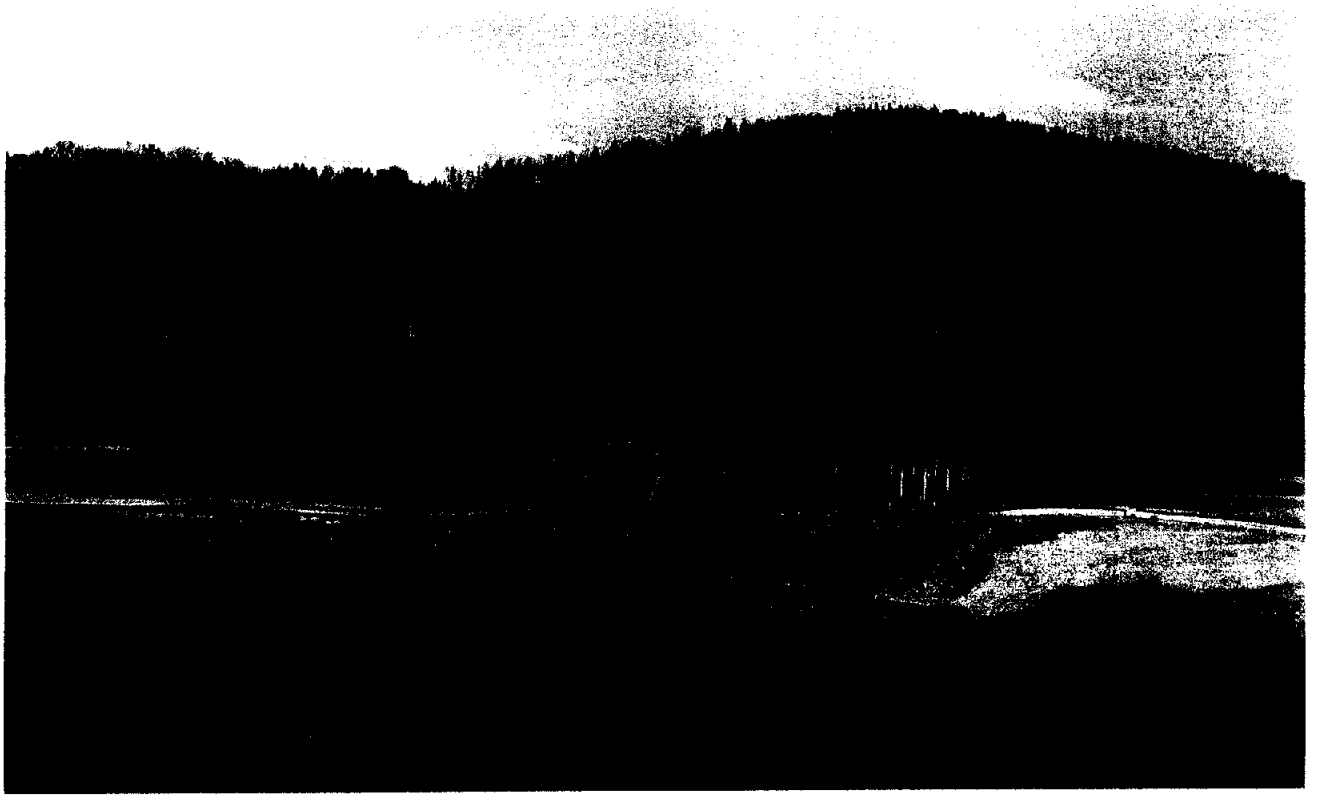

Most na Skawie przeznaczony do rozbiórki.

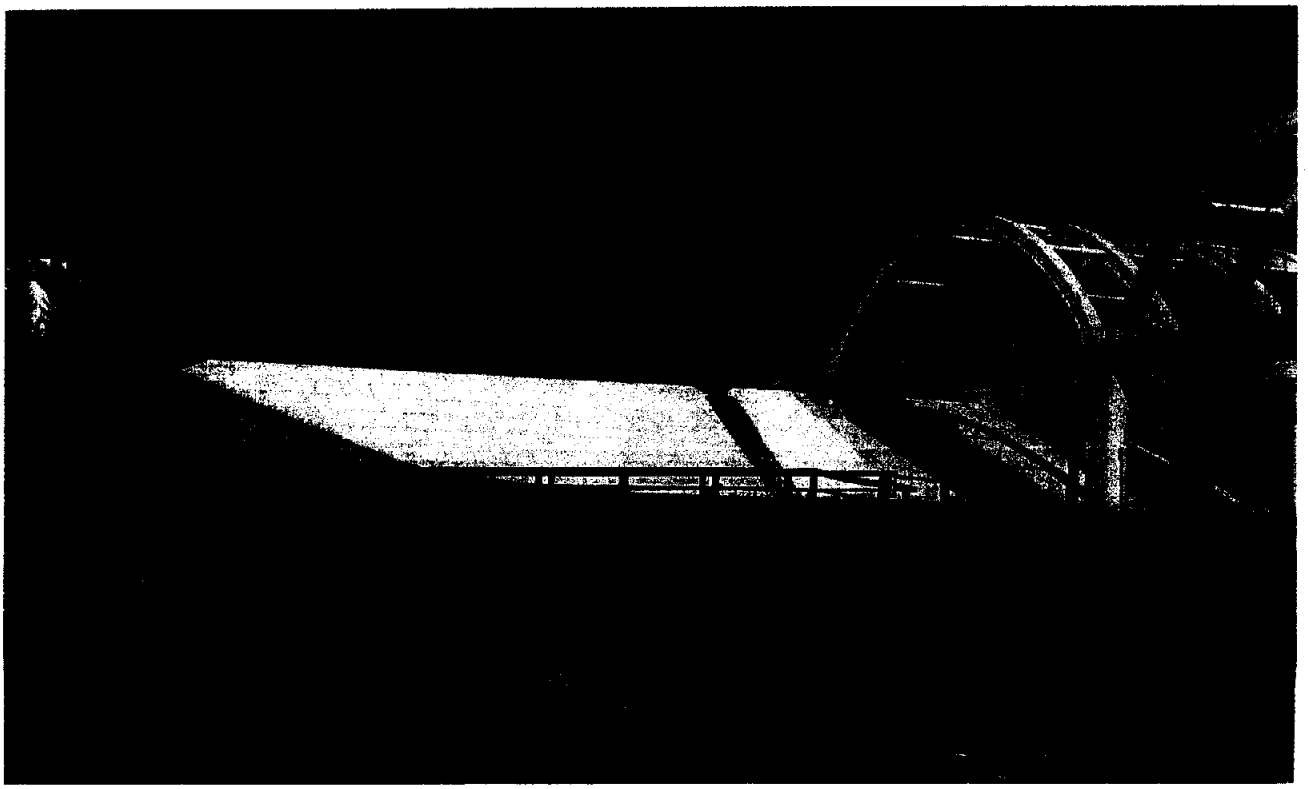


Przeznaczony do rozbiórki most na potoku Stryszówka, na tle nowo wybudowanych mostów.

Zadanie II – Przebudowa dróg



Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka, widok od strony zaplecza zbiornika.

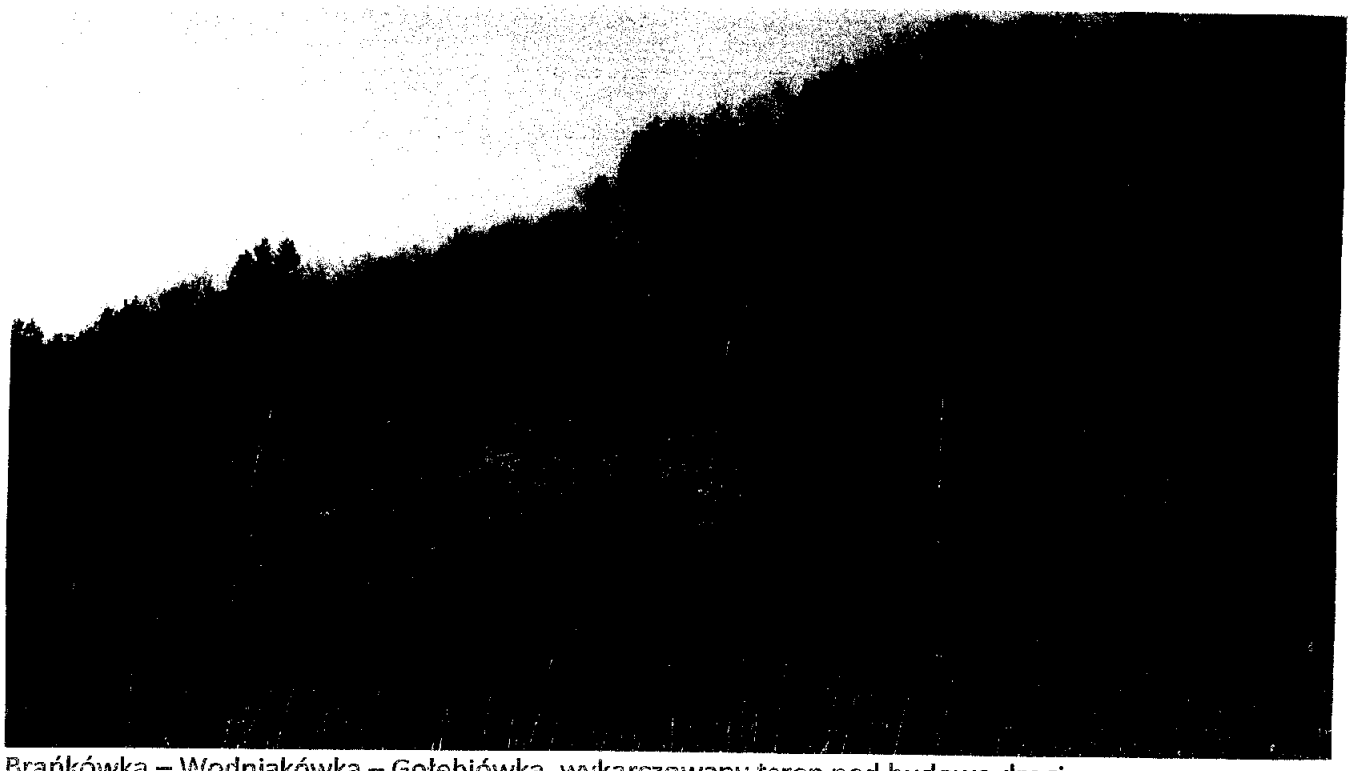

Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka, wykarczowany teren pod budowę drogi.
